

Annexe A

Échéancier




ID tâche	Description	Durée Restante	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Timeline																																																																																
					2004				2005				2006				2007				2008				2009				2010																																																								
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1500	ÎLOT E	316 *	05 JUL 04	08 NOV 05	05 JUL 04 — 08 NOV 05																																																																																
+ 1600	300 Viger	226 *	05 JUL 04	14 JUN 05	05 JUL 04 — 14 JUN 05																																																																																
+ 1700	333 Saint-Antoine	225 *	24 NOV 04	08 NOV 05	24 NOV 04 — 08 NOV 05																																																																																
+ 1900	1001 SAINT-DENIS	235 *	25 MAI 09	24 MAI 10	25 MAI 09 — 24 MAI 10																																																																																
+ 2000	ÎLOT B, ÉDIFICE BOCQUE	20 *	05 OCT 04	01 NOV 04	05 OCT 04 — 01 NOV 04																																																																																
2090	ÎLOT D	856 *	05 JUL 04	21 FEV 08	05 JUL 04 — 21 FEV 08																																																																																
2100	Démolitions	110 *	05 JUL 04	20 DEC 04	05 JUL 04 — 20 DEC 04																																																																																
+ 2200	Plans & Devis	301 *	05 JUL 04	14 OCT 05	05 JUL 04 — 14 OCT 05																																																																																
2300	Travaux préparatoires	165 *	31 AOU 04	03 MAI 05	31 AOU 04 — 03 MAI 05																																																																																
2400	Excavation	285 *	26 OCT 04	17 JAN 06	26 OCT 04 — 17 JAN 06																																																																																
2500	Fondations & superstructure	535 *	22 FEV 05	21 MAI 07	22 FEV 05 — 21 MAI 07																																																																																
2600	Enveloppe & toit	385 *	06 DEC 05	31 JUL 07	06 DEC 05 — 31 JUL 07																																																																																
2700	Aménagements intérieurs	399 *	20 AVR 06	19 DEC 07	20 AVR 06 — 19 DEC 07																																																																																
2800	Équipements & mise en service	299 *	24 OCT 06	30 JAN 08	24 OCT 06 — 30 JAN 08																																																																																
2900	Emménagements	116 *	29 AOU 07	21 FEV 08	29 AOU 07 — 21 FEV 08																																																																																
3000	ÎLOT A, BÂTIMENT EXISTANT	679 *	02 MAR 05	16 JAN 08	02 MAR 05 R — 16 JAN 08																																																																																
3100	Plans & devis	679 *	02 MAR 05	16 JAN 08	02 MAR 05 R — 16 JAN 08																																																																																
3200	Démolitions - partie nord	170 *	10 OCT 05	21 JUN 06	10 OCT 05 — 21 JUN 06																																																																																
3400	Aménagements intérieurs - partie nord	160 *	26 JAN 06	22 SEP 06	26 JAN 06 — 22 SEP 06																																																																																
3500	Installations & mise en service - partie	250 *	03 OCT 05	23 OCT 06	03 OCT 05 — 23 OCT 06																																																																																
3600	Emménagement - partie nord	112 *	19 MAI 06	09 NOV 06	19 MAI 06 — 09 NOV 06																																																																																
3700	Démolitions - partie sud	60 *	10 NOV 06	15 FEV 07	10 NOV 06 — 15 FEV 07																																																																																
3800	Aménagements intérieurs - partie sud	115 *	16 FEV 07	13 AOU 07	16 FEV 07 — 13 AOU 07																																																																																
3900	Équipements & Emménagement - partie	145 *	02 FEV 07	11 SEP 07	02 FEV 07 — 11 SEP 07																																																																																
4000	ÎLOT A, NOUVEAU BÂTIMENT	567 *	13 OCT 06	09 MAR 09	13 OCT 06 — 09 MAR 09																																																																																
4100	Démolitions	90 *	13 OCT 06	02 MAR 07	13 OCT 06 — 02 MAR 07																																																																																
4200	Plans & Devis	360 *	30 OCT 06	01 MAI 08	30 OCT 06 — 01 MAI 08																																																																																
4300	Excavation	150 *	08 JAN 07	21 AOU 07	08 JAN 07 — 21 AOU 07																																																																																
4400	Fondation & superstructure	235 *	12 JUN 07	06 JUN 08	12 JUN 07 — 06 JUN 08																																																																																
4500	Enveloppe & toit	195 *	13 DEC 07	15 OCT 08	13 DEC 07 * — 15 OCT 08																																																																																
4600	Aménagements intérieurs	182 *	02 MAI 08	16 FEV 09	02 MAI 08 — 16 FEV 09																																																																																
4700	Équipements & mise en service	192 *	02 MAI 08	02 MAR 09	02 MAI 08 — 02 MAR 09																																																																																
4800	Emménagements	137 *	13 AOU 08	09 MAR 09	13 AOU 08 — 09 MAR 09																																																																																
5000	ÎLOT B, BÂTIMENT EXISTANT	505 *	27 SEP 07	13 NOV 09	27 SEP 07 — 13 NOV 09																																																																																
5100	Plans & devis	176 *	27 SEP 07	16 JUN 08	27 SEP 07 — 16 JUN 08																																																																																
5200	Démolitions	335 *	21 DEC 07	25 MAI 09	21 DEC 07 — 25 MAI 09																																																																																
5400	Aménagements intérieurs	279 *	03 JUL 08	17 SEP 09	03 JUL 08 — 17 SEP 09																																																																																
5500	Équipements & mise en service	305 *	02 JUL 08	23 OCT 09	02 JUL 08 — 23 OCT 09																																																																																
5600	Emménagement	179 *	16 FEV 09	13 NOV 09	16 FEV 09 — 13 NOV 09																																																																																
6000	ÎLOT B, NOUVEAU BÂTIMENT	595 *	15 NOV 07	24 MAI 10	15 NOV 07 — 24 MAI 10																																																																																
6100	Démolitions	70 *	31 JAN 08	08 MAI 08	31 JAN 08 — 08 MAI 08																																																																																
6200	Plans & Devis	350 *	15 NOV 07	08 MAI 09	15 NOV 07 — 08 MAI 09																																																																																
6300	Excavation	235 *	24 JAN 08	22 JAN 09	24 JAN 08 — 22 JAN 09																																																																																
6400	Fondations & structure	205 *	25 SEP 08	11 AOU 09	25 SEP 08 — 11 AOU 09																																																																																
6500	Enveloppe & toit	235 *	27 FEV 09	26 FEV 10	27 FEV 09 — 26 FEV 10																																																																																
6600	Aménagements intérieurs	250 *	20 AVR 09	10 MAI 10	20 AVR 09 — 10 MAI 10																																																																																
6700	Équipements & mise en service	300 *	06 FEV 09	10 MAI 10	06 FEV 09 — 10 MAI 10																																																																																
6800	Emménagements	75 *	08 FEV 10	24 MAI 10	08 FEV 10 — 24 MAI 10																																																																																
+ 500	CENTRALE THERMIQUE	565 *	05 JUL 04	24 NOV 06	05 JUL 04 — 24 NOV 06																																																																																

Date	Révision	Vérifié	Approuvé
07 JUN 04	Non vérifié		
09 JUN 04	Lissé	vhf	LG

PROJET CHUM 2010
1000, Saint-Denis scénario 1 + 2B

Groupe AXOR inc.

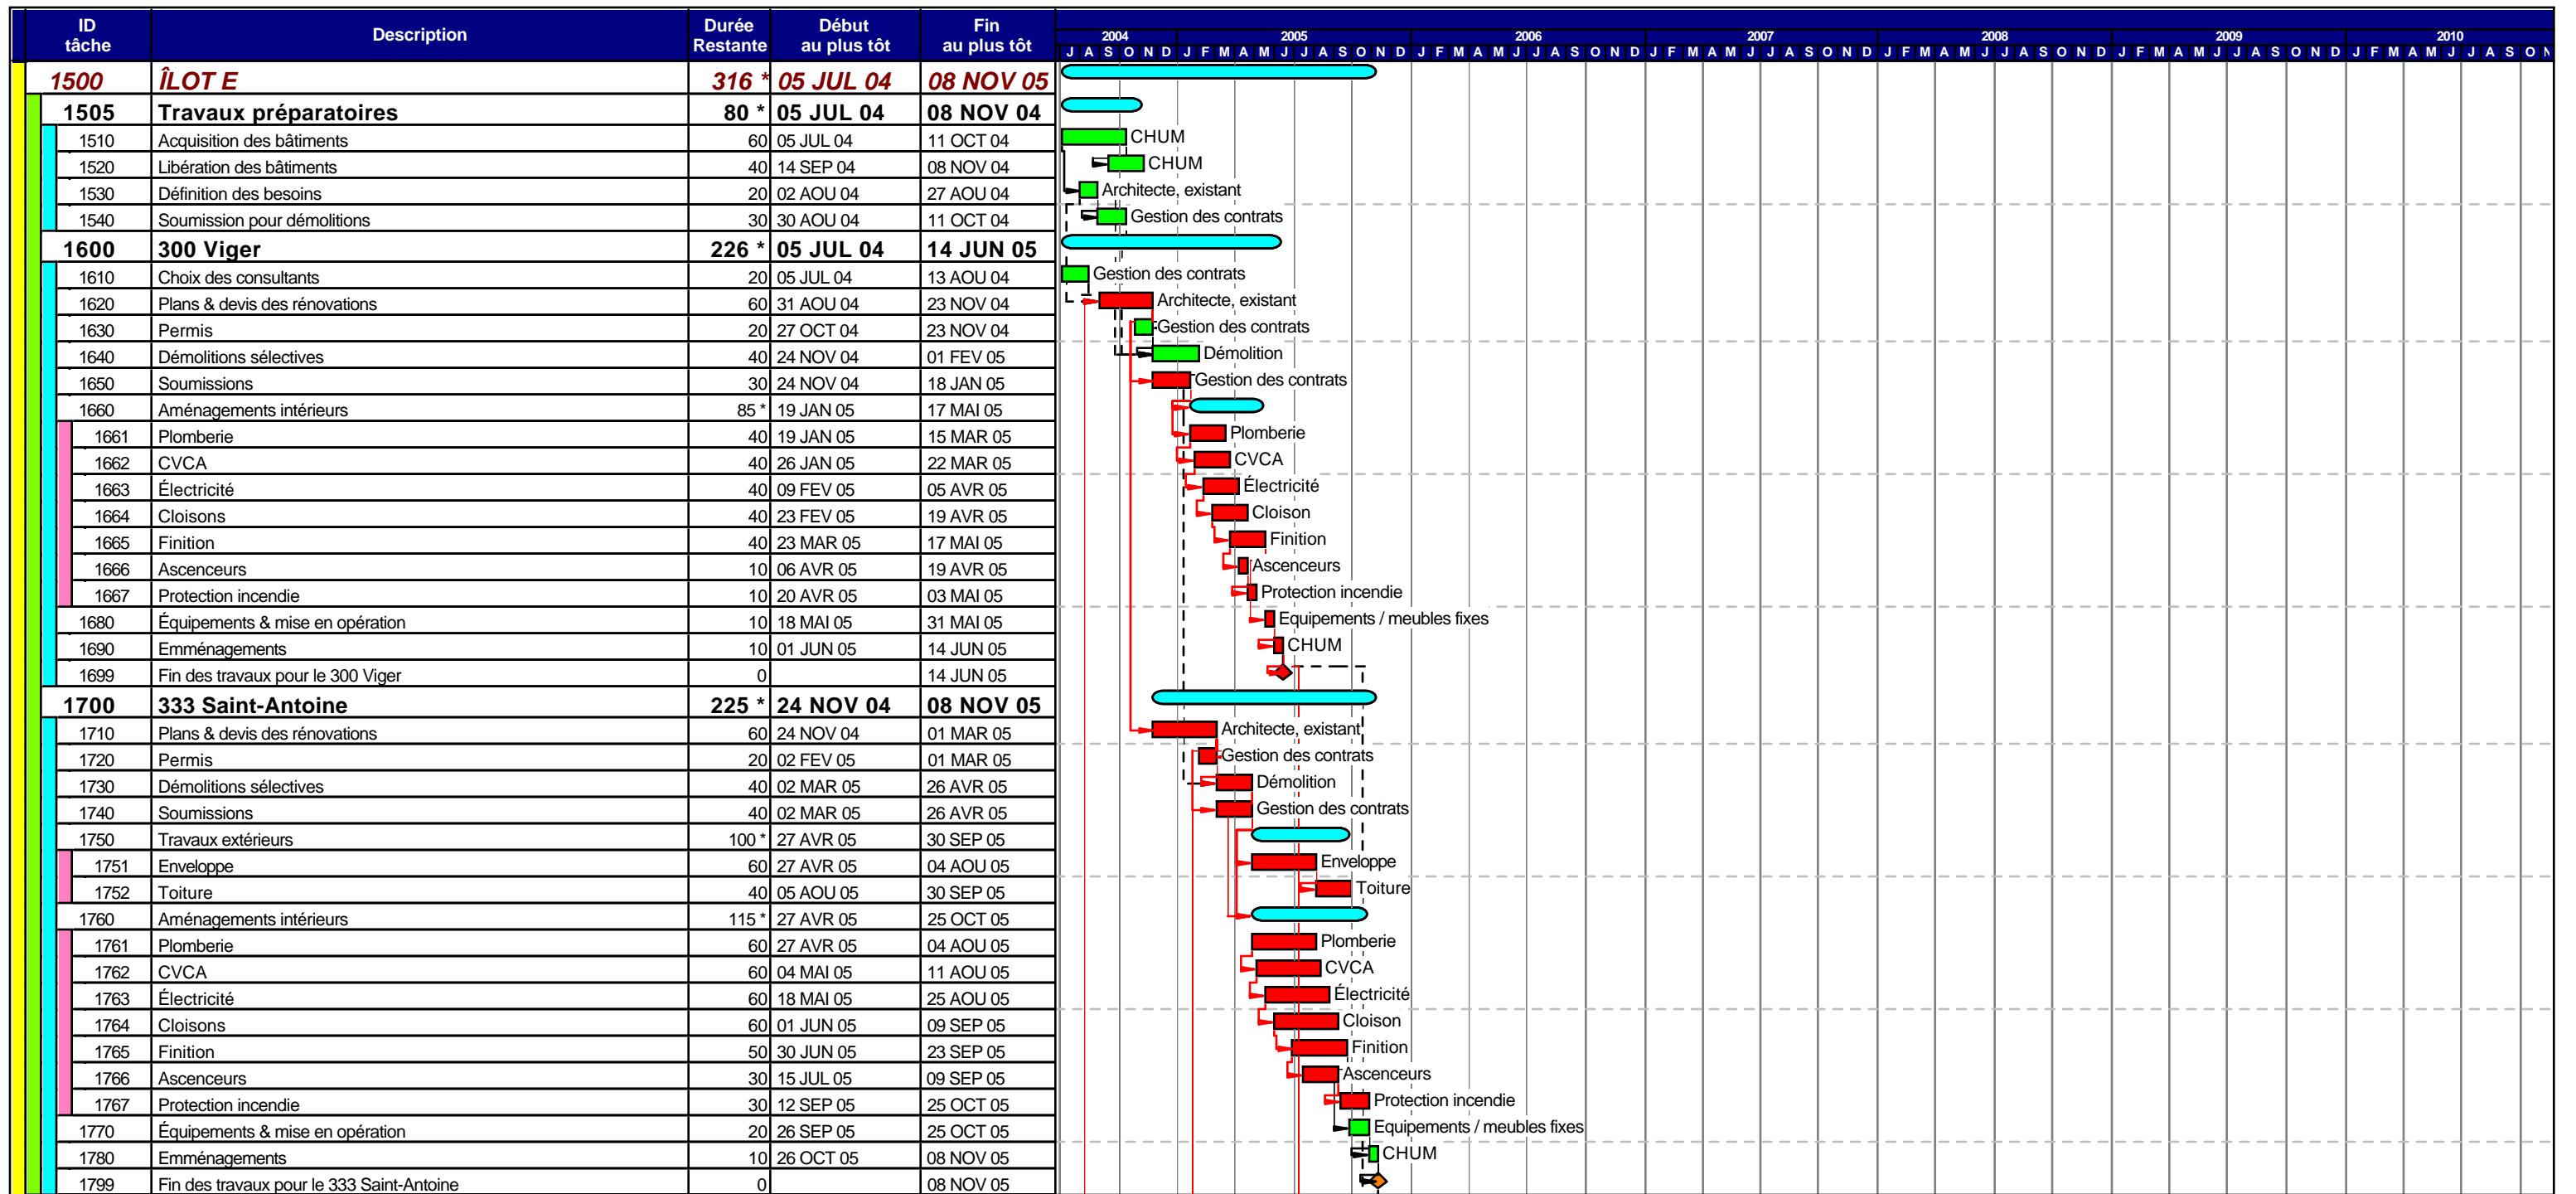

Date	Révision	Vérifié	Approuvé
07 JUN 04	Non vérifié		
09 JUN 04	lissé	vhf	LG

ID tâche	Description	Durée Restante	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	2004												2005												2006												2007												2008												2009												2010																							
					J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																										
1900	1001 SAINT-DENIS	235 *	25 MAI 09	24 MAI 10																																																																																																
1905	1001 Saint-Denis	235 *	25 MAI 09	24 MAI 10																																																																																																
1910	Plans & devis des rénovations	40	25 MAI 09 *	04 AOU 09																																																																																																
1920	Permis	20	22 JUN 09	04 AOU 09																																																																																																
1930	Démolitions sélectives	20	05 AOU 09	01 SEP 09																																																																																																
1940	Soumissions	40	05 AOU 09	01 OCT 09																																																																																																
1950	Travaux extérieurs	100 *	02 OCT 09	05 MAR 10																																																																																																
1951	Enveloppe	60	02 OCT 09	08 JAN 10																																																																																																
1952	Toiture	40	11 JAN 10	05 MAR 10																																																																																																
1960	Aménagements intérieurs	133 *	02 OCT 09	22 AVR 10																																																																																																
1961	Plomberie	90	02 OCT 09	19 FEV 10																																																																																																
1962	CVCA	90	09 OCT 09	26 FEV 10																																																																																																
1963	Électricité	90	26 OCT 09	12 MAR 10																																																																																																
1964	Cloisons	90	09 NOV 09	26 MAR 10																																																																																																
1965	Finition	88	07 DEC 09	22 AVR 10																																																																																																
1966	Ascenceurs	30	21 DEC 09	12 FEV 10																																																																																																
1967	Protection incendie	30	15 FEV 10	26 MAR 10																																																																																																
1970	Équipements & mise en opération	10	23 AVR 10	06 MAI 10																																																																																																
1980	Emménagements	12	07 MAI 10	24 MAI 10																																																																																																
1999	Fin des travaux pour le 1001 Saint-Denis	0		24 MAI 10																																																																																																

Date	Révision	Vérifié	Approuvé
07 JUN 04	Non vérifié		
09 JUN 04	lissé	vhf	LG

ID tâche	Description	Durée Restante	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	2004				2005				2006				2007				2008				2009				2010																															
					J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
2000	<i>ÎLOT B, ÉDIFICE BOCQUE</i>	20 *	05 OCT 04	01 NOV 04																																																								
2010	Démolition	20 *	05 OCT 04	01 NOV 04																																																								
2160	Démolition de l'édifice Bocque	20	05 OCT 04	01 NOV 04																																																								


Date	Révision	Vérifié	Approuvé
07 JUN 04	Non vérifié		
09 JUN 04	lissé	vhf	LG

PROJET CHUM 2010
1000 Saint-Denis scénario 1 + 2B

Groupe AXOR INC.

ID tâche	Description	Durée Restante	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	2004												2005												2006												2007												2008												2009												2010												
					J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J
2090	ÎLOT D	856 *	05 JUL 04	21 FEV 08																																																																																					
2100	Démolitions	110 *	05 JUL 04	20 DEC 04																																																																																					
2110	Acquisitions	20	05 JUL 04	13 AOU 04																																																																																					
2120	Libérations / déménagements	20	16 AOU 04	13 SEP 04																																																																																					
2130	Soumissions	30	16 AOU 04	27 SEP 04																																																																																					
2140	Pemis de démolitions	20	10 AOU 04	07 SEP 04																																																																																					
2150	Travaux de démolitions	60	28 SEP 04 R	20 DEC 04																																																																																					
2200	Plans & Devis	301 *	05 JUL 04	14 OCT 05																																																																																					
2210	PFT finale & Choix des consultants	20	05 JUL 04	13 AOU 04																																																																																					
2230	Plans & Devis préliminaires	31	05 JUL 04	30 AOU 04																																																																																					
2240	Approbation des plans & devis préliminaires	0		30 AOU 04																																																																																					
2250	Plan & devis d'exécution	270 *	31 AOU 04	14 OCT 05																																																																																					
2251	P&D d'excavation	20	15 SEP 04	12 OCT 04																																																																																					
2252	P&D fondations & superstructure	90	21 SEP 04	07 FEV 05																																																																																					
2253	P&D enveloppe & toit	90	30 NOV 04 R	18 JAN 05																																																																																					
2254	P&D aménagements intérieurs	180	19 JAN 05	14 OCT 05																																																																																					
2300	Travaux préparatoires	165 *	31 AOU 04	03 MAI 05																																																																																					
2310	Plans des services municipaux	40	31 AOU 04	26 OCT 04																																																																																					
2320	Travaux aux infrastructures municipales	60	27 OCT 04	01 FEV 05																																																																																					
2330	Plan de circulation	30	08 DEC 04	01 FEV 05																																																																																					
2340	Bureau de chantier	15	12 JAN 05	01 FEV 05																																																																																					
2350	Études & relocalisation des utilités publiques	160	08 SEP 04	03 MAI 05																																																																																					
2400	Excavation	285 *	26 OCT 04	17 JAN 06																																																																																					
2410	Soumissions	30	26 OCT 04	06 DEC 04																																																																																					
2420	Protection du chantier	10	15 DEC 04 R	10 JAN 05																																																																																					
2440	Mur en parois moulées - partie sud	100	21 DEC 04	23 MAI 05																																																																																					
2445	Mur en parois moulées - partie nord	100	24 MAI 05	31 OCT 05																																																																																					
2460	Excavation & roc - partie sud	115	01 FEV 05	13 JUL 05																																																																																					
2450	Excavation & roc - partie nord	110	14 JUL 05	17 JAN 06																																																																																					
2500	Fondations & superstructure	535 *	22 FEV 05	21 MAI 07																																																																																					
2510	Soumissions	40	22 FEV 05	18 AVR 05																																																																																					
2530	Travaux de fondations	240	26 AVR 05	02 MAI 06																																																																																					
2540	Travaux de superstructure	340	13 DEC 05	21 MAI 07																																																																																					
2600	Enveloppe & toit	385 *	06 DEC 05	31 JUL 07																																																																																					
2610	Soumission	40	06 DEC 05	14 FEV 06																																																																																					
2630	Travaux d'enveloppe	320	22 FEV 06	18 JUN 07																																																																																					
2640	Travaux de toiture	20	19 JUN 07	31 JUL 07																																																																																					
2700	Aménagements intérieurs	399 *	20 AVR 06	19 DEC 07																																																																																					
2710	Soumissions	40	20 AVR 06	14 JUN 06																																																																																					
2730	Ascenceurs	80	14 JUN 06	20 OCT 06																																																																																					
2740	Protection incendie	80	23 OCT 06	23 FEV 07																																																																																					
2750	CVCA	300	17 MAI 06	28 AOU 07																																																																																					
2760	Plomberie	300	14 JUN 06	26 SEP 07																																																																																					
2770	Électricité	300	10 AOU 06	07 NOV 07																																																																																					
2780	Cloisons	300	24 AOU 06	21 NOV 07																																																																																					
2790	Finition	300	22 SEP 06	19 DEC 07																																																																																					
2800	Équipements & mise en service	299 *	24 OCT 06	30 JAN 08																																																																																					
2810	Plans & devis	120	24 OCT 06	24 AVR 07																																																																																					
2820	Achats	120	26 FEV 07	28 AOU 07																																																																																					
2830	Équipements	120	01 AOU 07	30 JAN 08																																																																																					
2840	Mise en opération	80	27 SEP 07	30 JAN 08																																																																																					
2900	Emménagements	116 *	29 AOU 07	21 FEV 08																																																																																					
2910	Plans d'emménagement	80	29 AOU 07	19 DEC 07																																																																																					
2920	Préparation des déménagements	30	20 DEC 07	13 FEV 08																																																																																					
2930	Emménagement	16	31 JAN 08	21 FEV 08																																																																																					
2990	Fin des travaux du l' ÎLOT D	0		21 FEV 08																																																																																					

Date	Révision	Vérifié	Approuvé
07 JUN 04	Non vérifié		
09 JUN 04	lissé	yhf	LG

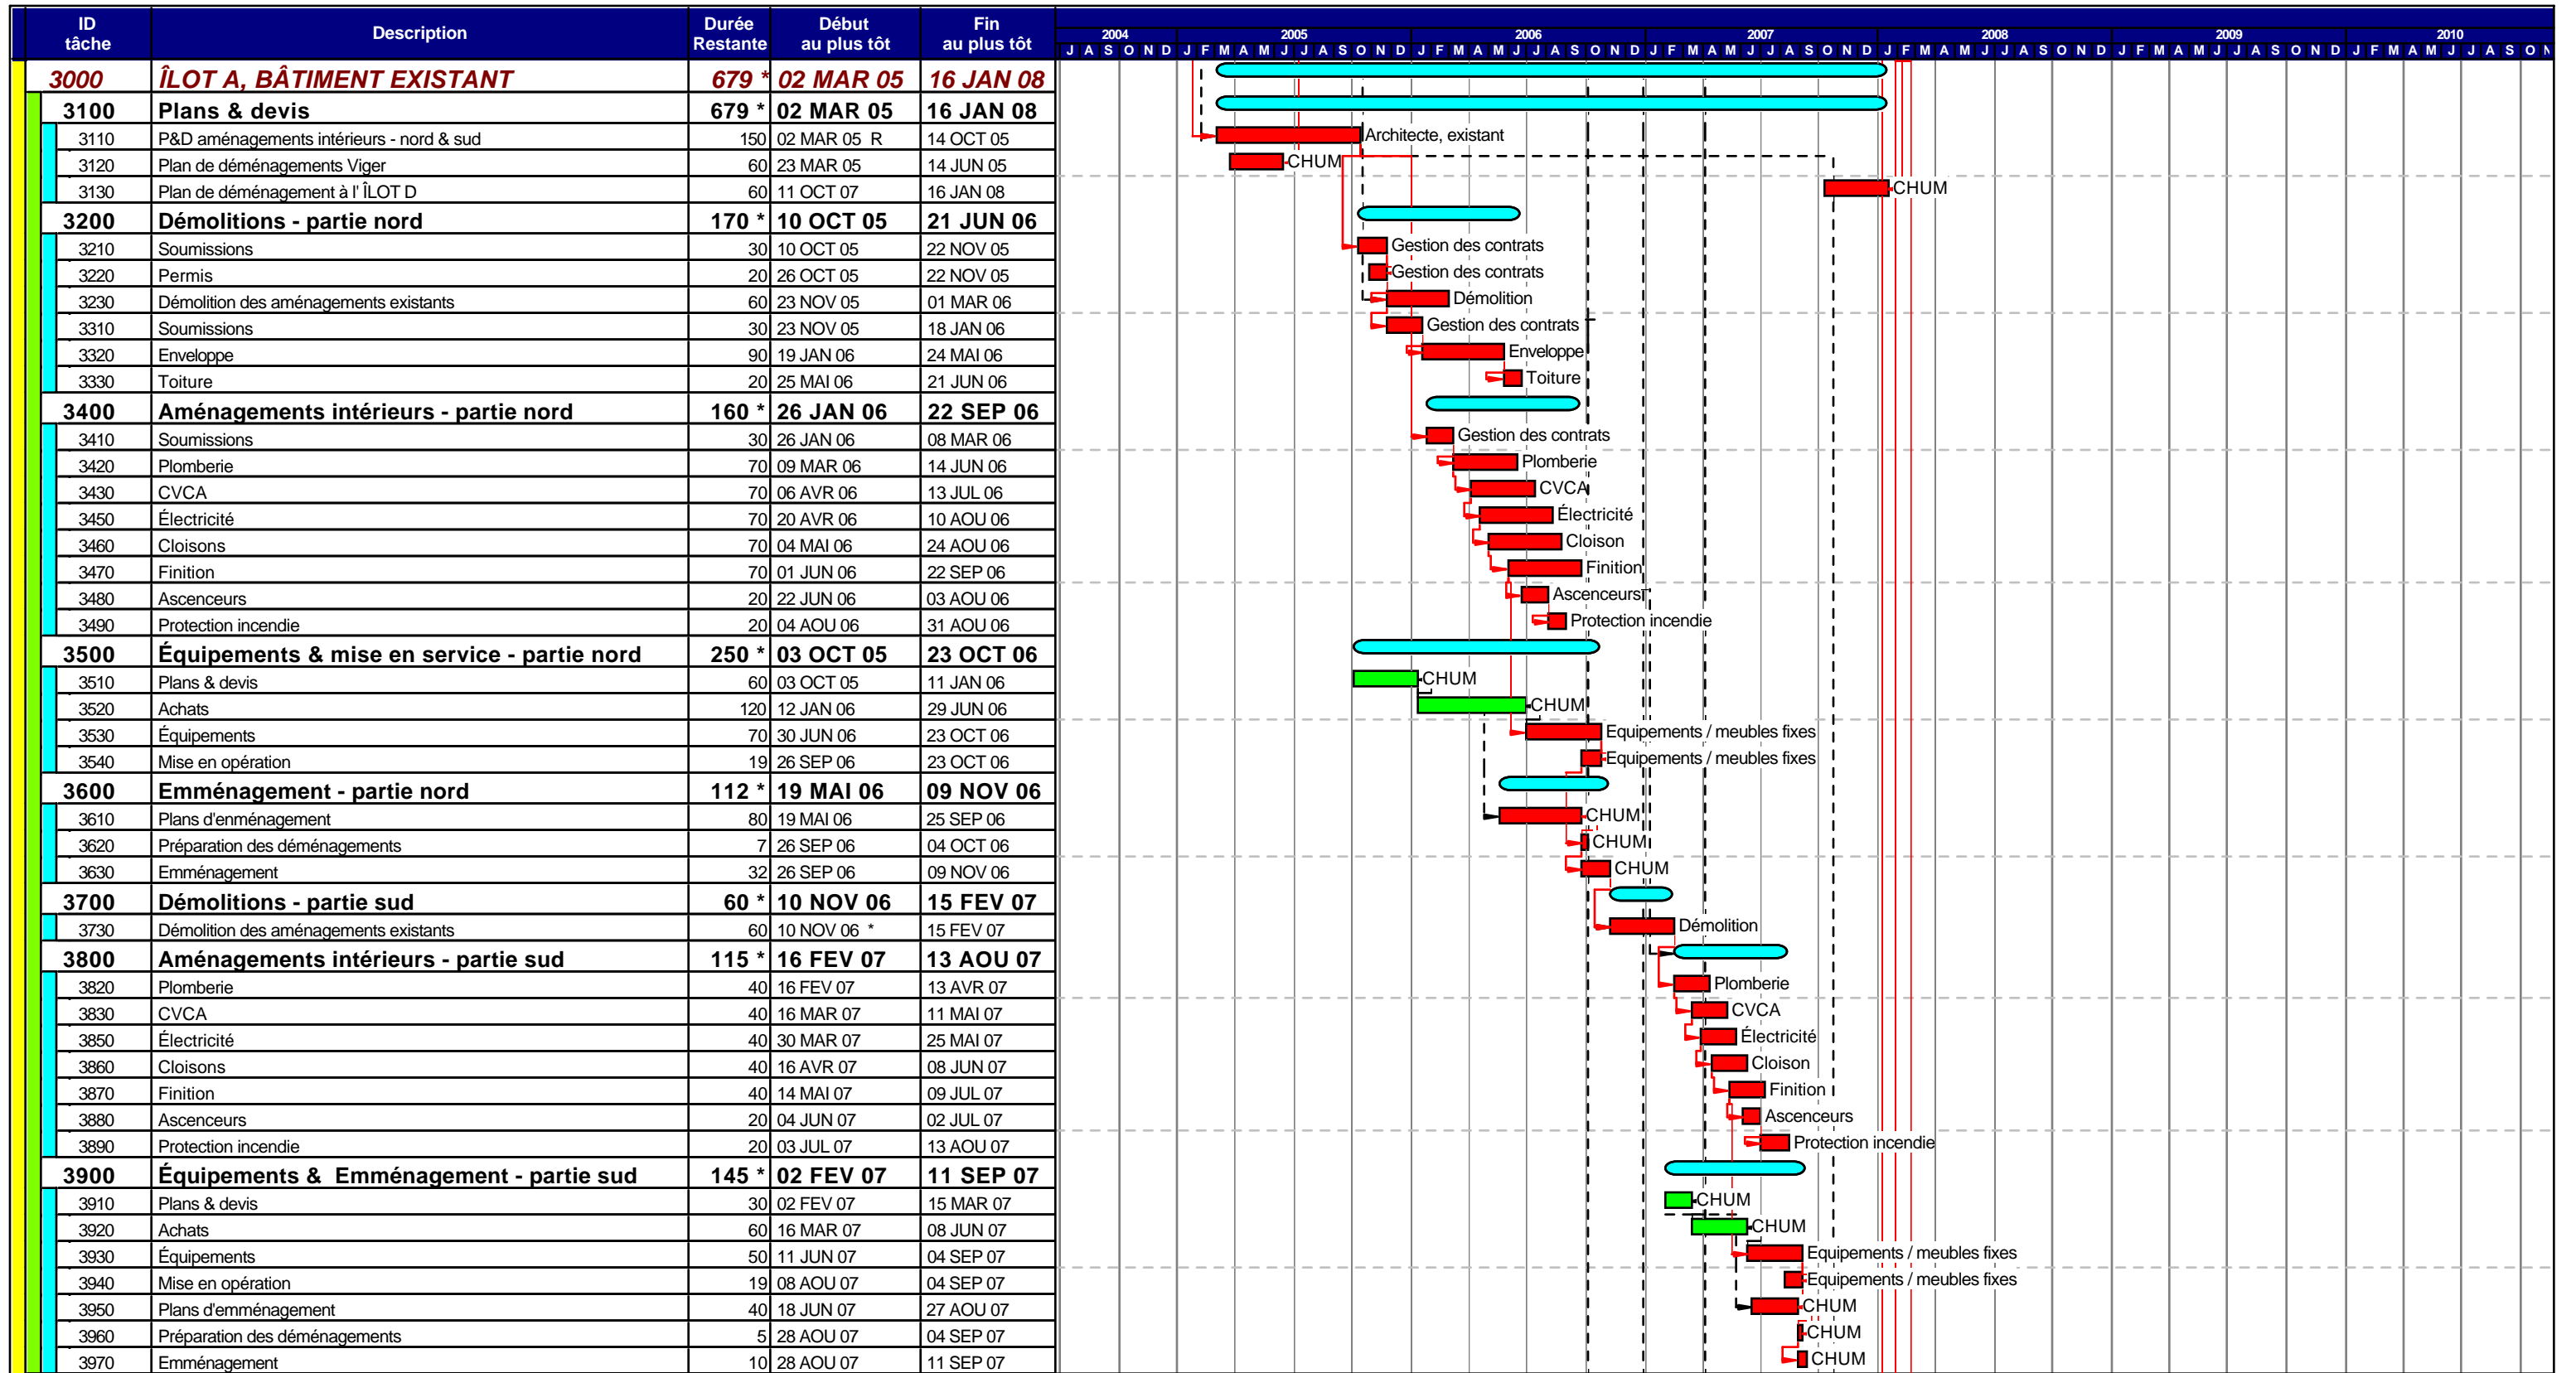

Date	Révision	Vérifié	Approuvé
07 JUN 04	Non vérifié		
09 JUN 04	lissé	vhf	LG


ID tâche	Description	Durée Restante	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	2004												2005												2006												2007												2008												2009												2010											
					J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																		
4000	ÎLOT A, NOUVEAU BÂTIMENT	567 *	13 OCT 06	09 MAR																																																																																				
4100	Démolitions	90 *	13 OCT 06	02 MAR 07																																																																																				
4110	Soumission	30	13 OCT 06	24 NOV 06																																																																																				
4120	Permis	20	30 OCT 06	24 NOV 06																																																																																				
4130	Démolition de la centrale thermique	60	27 NOV 06	02 MAR 07																																																																																				
4200	Plans & Devis	360 *	30 OCT 06	01 MAI 08																																																																																				
4210	P&D d'excavation	30	30 OCT 06	08 DEC 06																																																																																				
4220	P&D fondations & superstructure	82	25 JAN 07	21 MAI 07																																																																																				
4230	P&D enveloppe & toit	90	01 MAI 07	19 SEP 07																																																																																				
4240	P&D aménagements intérieurs	140	04 OCT 07	01 MAI 08																																																																																				
4300	Excavation	150 *	08 JAN 07	21 AOU 07																																																																																				
4310	Soumissions	30	08 JAN 07	16 FEV 07																																																																																				
4320	Installation des entrepreneurs	10	19 FEV 07	02 MAR 07																																																																																				
4330	Protection du chantier	10	19 FEV 07	02 MAR 07																																																																																				
4340	Murs en parois moulées	80	05 MAR 07	26 JUN 07																																																																																				
4350	Excavation & roc	90	03 AVR 07	21 AOU 07																																																																																				
4400	Fondation & superstructure	235 *	12 JUN 07	06 JUN 08																																																																																				
4410	Soumissions	30	12 JUN 07	07 AOU 07																																																																																				
4420	Installation des entrepreneurs	20	08 AOU 07	05 SEP 07																																																																																				
4430	Travaux de fondations	60	15 AOU 07	07 NOV 07																																																																																				
4440	Travaux de structure	140	08 NOV 07	06 JUN 08																																																																																				
4500	Enveloppe & toit	195 *	13 DEC 07 *	15 OCT 08																																																																																				
4510	Soumission	30	13 DEC 07	06 FEV 08																																																																																				
4520	Installation des entrepreneurs	11	07 FEV 08	21 FEV 08																																																																																				
4530	Travaux d'enveloppe	140	14 FEV 08	17 SEP 08																																																																																				
4540	Travaux de toiture	20	18 SEP 08	15 OCT 08																																																																																				
4600	Aménagements intérieurs	182 *	02 MAI 08	16 FEV 09																																																																																				
4610	Soumissions	30	02 MAI 08	13 JUN 08																																																																																				
4620	Plomberie	132	09 MAI 08	01 DEC 08																																																																																				
4630	CVCA	132	16 MAI 08	08 DEC 08																																																																																				
4640	Électricité	132	02 JUN 08	05 JAN 09																																																																																				
4650	Cloisons	132	16 JUN 08	19 JAN 09																																																																																				
4660	Finition	132	30 JUL 08	16 FEV 09																																																																																				
4670	Ascenceurs	50	13 AOU 08	23 OCT 08																																																																																				
4680	Protection incendie	60	24 OCT 08	29 JAN 09																																																																																				
4700	Équipements & mise en service	192 *	02 MAI 08	02 MAR 09																																																																																				
4710	Plans & devis	60	02 MAI 08	12 AOU 08																																																																																				
4720	Achats	80	13 OCT 08	16 FEV 09																																																																																				
4730	Équipements	60	25 NOV 08	02 MAR 09																																																																																				
4740	Mise en opération	20	03 FEV 09	02 MAR 09																																																																																				
4800	Emménagements	137 *	13 AOU 08	09 MAR 09																																																																																				
4810	Plans d'emménagement	60	13 AOU 08	06 NOV 08																																																																																				
4820	Préparation des déménagements	5	24 FEV 09	02 MAR 09																																																																																				
4830	Emménagement	10	24 FEV 09	09 MAR 09																																																																																				
4990	Fin des travaux de l' ÎLOT A	0		09 MAR 09																																																																																				



Date	Révision	Vérfié	Approuvé
07 JUN 04	Non vérifié		
09 JUN 04	lissé	vhf	LG

PROJET CHUM 2010
 1000 Saint-Denis scénario 1 + 2B

Groupe AXOR INC.

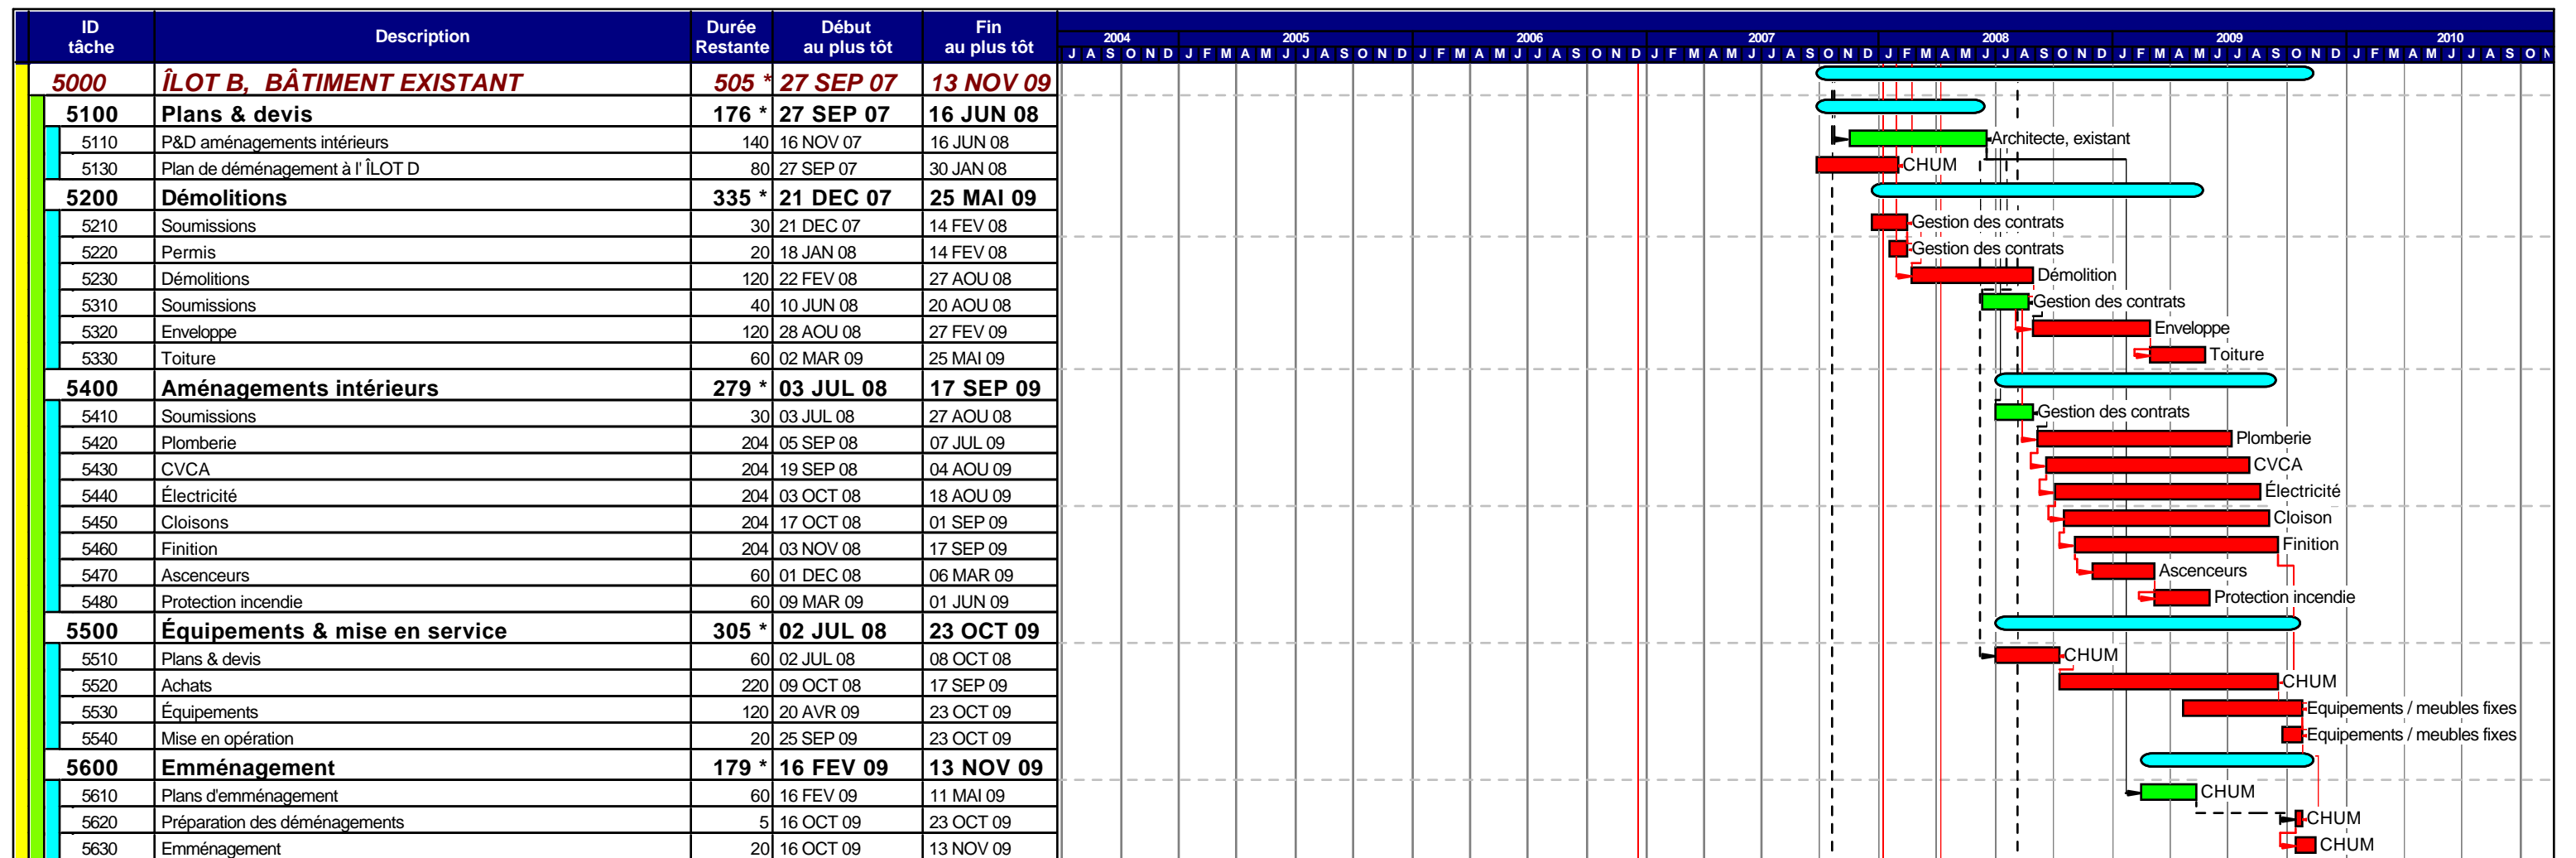

Date	Révision	Vérifié	Approuvé
07 JUN 04	Non vérifié		
09 JUN 04	lissé	vhf	LG

